

Maison Puech Calvinet
SITUATION DE CHANTIER N°12
Samedi 16 Mars 2025

	Adresse	Téléphone	Email	pr és	Abs	Inv	Prochai ne réunion
Propriétaire : Antoine Puech	14 rue du Colombier, Calvinet, 15340 Puycapel	0678889882 0975885861	Antoine.puech@gmail.com				
Gros Œuvre : SARL Mazac	Le Bos, Calvinet, 15340 Puycapel	0617605068 0471499241	mazac.sarl@wanadoo.fr				
Couverture Cédric Marcenac – Châtaigneraie couverture	6 rue de la fontaine, 15340 Cassaniouze	0471634808 0647939622	cedric.marcenac@orange.fr				
Placo / isolation / Menuiseries intérieures / Charpente Didier Dureuil	ZAC de la Viale 15340 Cassaniouze	0670600632 0471496625	menuiserie.dureuil@sfr.fr				
Electricité/ plomberie/ Chauffage Laurent BRU	LE BOURG 15340 CALVINET	0680173111 0471499977	bru-laurent@wanadoo.fr				

AVANCEMENT DES TRAVAUX :


- Etanchéité toiture faite.
- Livraison et pose des menuiseries S13 : 24 au 29 Mars
- Info : Arrivée du locataire au n16 rue du Colombier prévue le 15 Avril 2025
- Réunion de chantier Samedi 29 Mars 9h

Prochaines étapes :

- Disposer le bidim + les gravillons sur le toit terrasse.
- Préparer les seuils des menuiseries RC – cf. annexe pour la baie : Fixation du seuil baie par 3 pattes + vis autoforantes non traversantes
- Boucher les ouvertures pour consolider la maçonnerie : en priorité côté coffret électrique
- Réaliser l'embranchement
- Percer les accès escalier / mezzanine
- Réaliser dallage Garage : réseaux EP et EU
- Pose des menuiseries S13 puis enchaîner sur le placo



Détails encastrement baie :

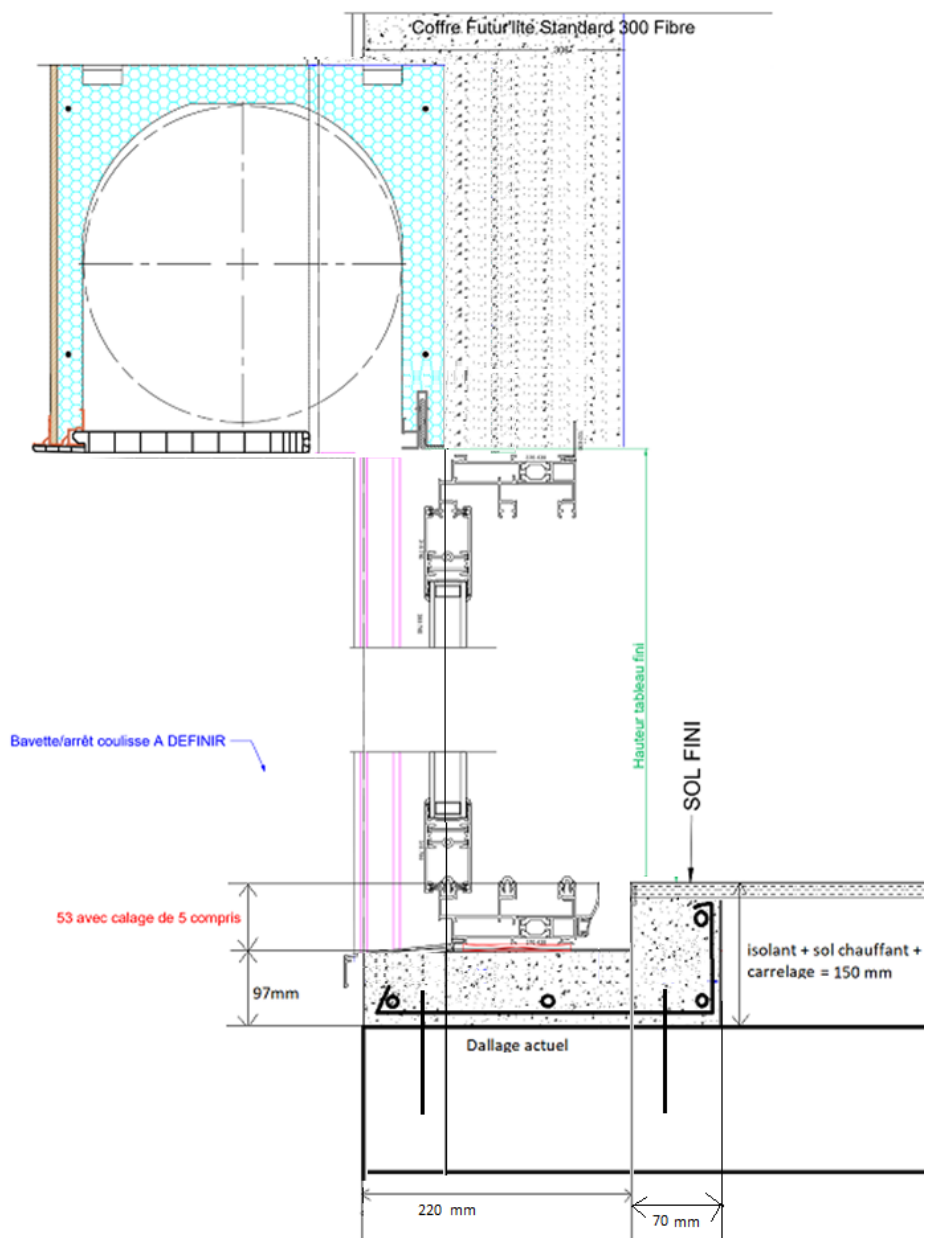

Bloc appui baie vitrée à réaliser

Aligné au mur extérieur

